

Stavební úpravy prostoru vnitřního schodiště levého křídla zámku

Byla odstraněna vyvýšená část podlahy před schodištěm, provedena hydroizolace a položena nová kamenná dlažba chodby. Dále byla oklepána omítka vnitřních stěn a provedena oprava omítek stropů.


Kanalizace, která vedla pod stropem, byla přeložena. Dřevěné stupně schodiště byly přebroušené a natřené lazurními nátěry.

Stávající madla byla vyměněna za kovářské výrobky. Okenní otvory a vstupní dveře byly repasované a do oken jsou zhotovené kovové atypické mříže.

Realizace projektu: srpen – říjen roku 2012

Dotace: Ministerstvo kultury	260 000,- Kč
Moravskoslezský kraj	325 700,- Kč
Obec Jezdkovice	66 132,- Kč
Celkové náklady:	651 832,- Kč

Před realizací

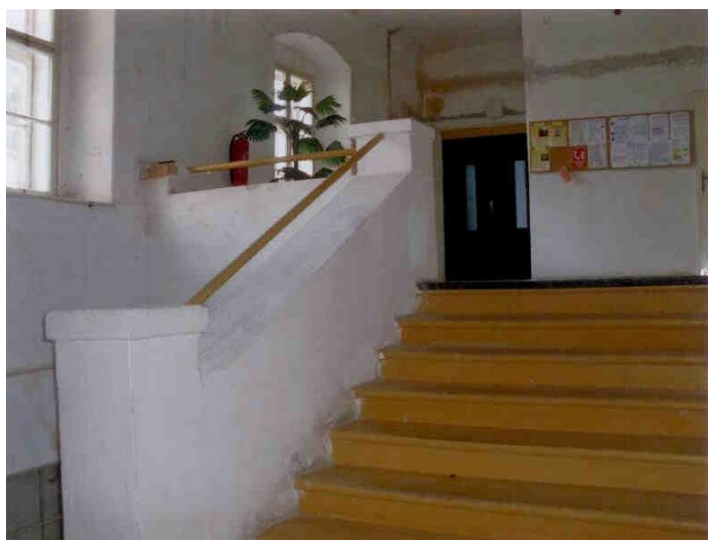

Po realizaci

